

รายงาน การก่อสร้างบ้านพัก สวท.ขอนแก่น

วันที่ 6 ก.ค. 69

บ้านพักข้าราชการระดับ 1 – 2

- บ้านระดับ 1-2 จากสัปดาห์ที่แล้วได้ดำเนินการถึงการเทหล่อเสาของชั้น 2 เสร็จเรียบร้อยแล้วทั้ง 4 หลังแล้ว ขั้นตอนต่อไป คือการผูกเหล็กเข้าแบบคานของชั้น 2 และได้เริ่มทำการตั้งนั่งร้านเหล็กพร้อมกับขั้นตอนการผูกเหล็กคานของชั้น 2 แล้ว กำลังดำเนินการจากบ้านหลังที่ 1 และมีการท่อดมื่อเพื่อหล่อบันไดของทั้ง 4 หลังแล้ว





บ้านพักข้าราชการระดับ 5 - 6


- จากสัปดาห์ที่แล้วได้ดำเนินการเทหล่อคานของชั้น 2 เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว วันนี้ (6 ก.ค. 69) ได้ดำเนินการวางแผ่นพื้นสำเร็จรูปเพื่อเทพื้นของชั้นที่ 2 ไปแล้ว 1 หลัง เหลือวางแผ่นพื้นสำเร็จรูปเพิ่มอีก 1 หลัง จึงจะสามารถเทพื้นของชั้นที่ 2 ได้ ตามขั้นตอนต่อไปในงวดงานที่ 3





บ้านพักข้าราชการระดับ 7 – 8

-จากสัปดาห์ที่แล้วได้ดำเนินการวางแผนพื้นสำเร็จรูปและเทพื้นของชั้น 2 เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว วันนี้ (6ก.ค. 69) ได้มีการดำเนินการผูกเหล็กเพื่อหล่อเสารับคานของชั้น 2 เป็นขั้นตอนต่อไปในงวดงานที่ 3

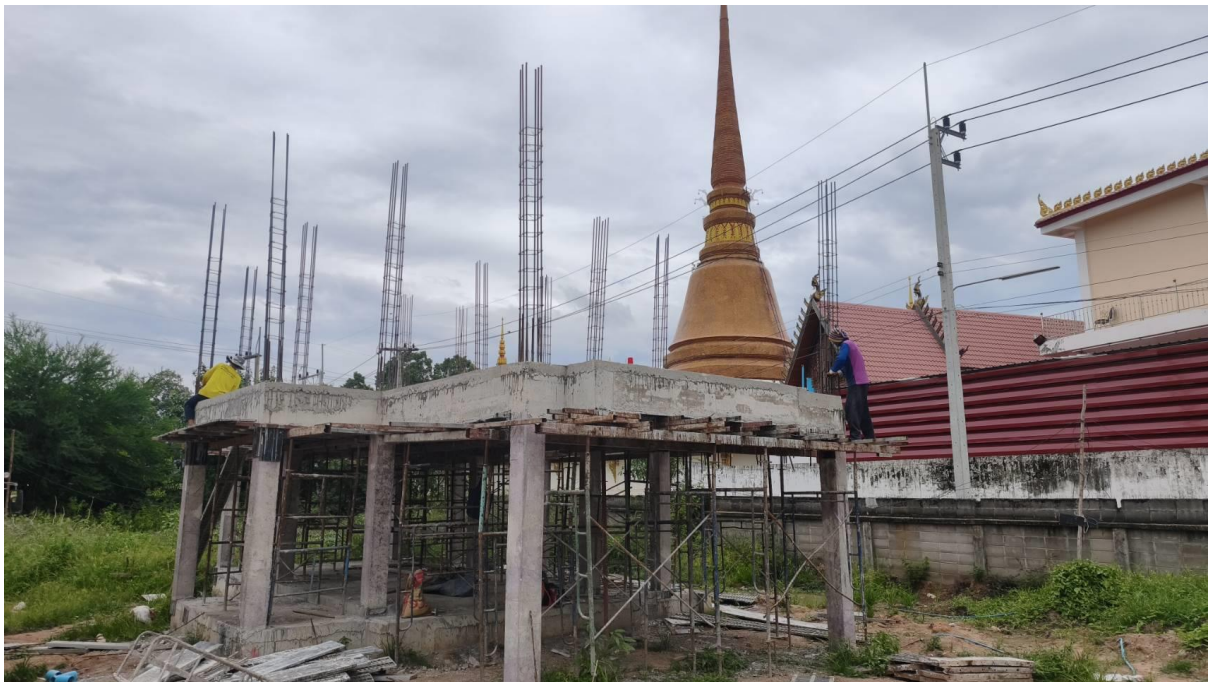



หมายเหตุ
